SUITE HIDROMINERAL PRO — REPORTE GERENCIAL DE OPERACIONES

Evaluación Integral de Procesos, Confiabilidad y Rentabilidad Minera

1. Desempeño Operacional por Circuito de Planta

Área / Circuito	Parámetro Monitoreado	Valor Actual	Meta / Diseño	Estado
M1 Chancado	Tonelaje Tratado	2.330 t/h	2.500 t/h	Óptimo
M2 Aglomeración	Humedad en Tambor	7,50 %	7,0 - 8,0 %	Conforme
M3 Lixiviación	Recuperación Acumulada	82,00 %	80,00 %	Excelente
M4 SX	Eficiencia Extracción	96,50 %	95,00 %	Conforme
M5 EW	Producción Cátodos Grado A	346,0 t/día	340,0 t/día	Sobrecumplido
M8 Finanzas	VAN del Proyecto (10 Años)	$393,7 MM USD	$350 MM USD	Altamente Rentable

2. Indicadores de Eficiencia Operacional por Circuito (%)

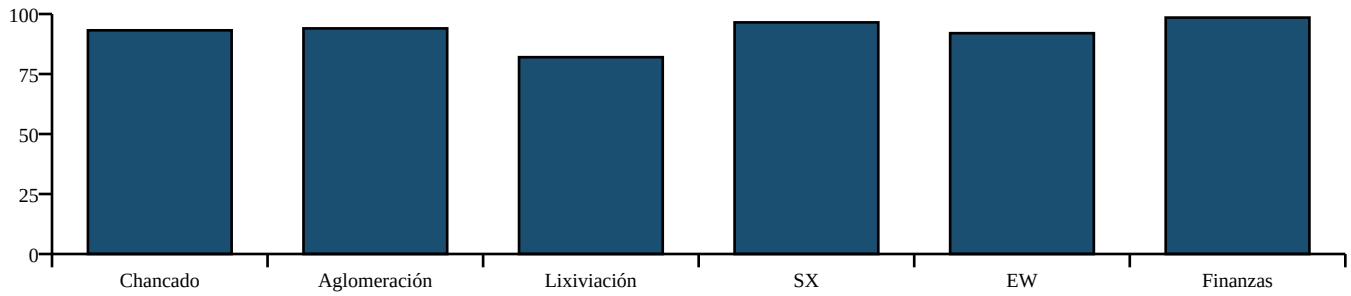

3. Consolidado Financiero y Productivo Anual

Indicador Macroeconómico / Planta	Proyección Anual	Parámetro Financiero	Valor Comercial
Producción Anual de Cátodos	126.300 t/año	Precio de Venta Cobre	4,15 USD/lb
Costo Operacional Global (OPEX)	1,85 USD/lb	Tasa Descuento (WACC)	8,5 %
EBITDA Operacional Estimado	$564,2 MM USD	TIR del Proyecto	15,0 %

4. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

1. **Estabilidad Operacional:** El complejo hidrometalúrgico opera de manera sólida, destacando el cumplimiento riguroso en la producción de cátodos de alta pureza (Grado A) en la sección de Electroobtención.
2. **Oportunidad de Mejora:** Se recomienda intensificar los controles de compactación y canales preferenciales en las pilas de lixiviación (M3) para asegurar que la cinética de extracción mantenga una tendencia superior a la proyectada.
3. **Viabilidad Financiera:** Los indicadores económicos del Módulo 8 confirman la absoluta robustez del proyecto, arrojando un VAN de $393,7 millones de dólares y un retorno sumamente favorable para la inversión corporativa.
